

BOLETIM DE MEDIÇÃO

004

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 25/02/2022

VALOR DA MEDIÇÃO: 55.165,58



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DE ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL PAULO VIANA DE QUEIROZ, NO MUNICÍPIO DE FERREIROS

CONTRATO: 085/SMOF/2-021 MODALIDADE: TP N°007/2021 PRAZOS DE EXEC.: 29/11/2021 28/04/2022

ORDEM DE SERVIÇOS: 29/11/2021 PRAZO (DIAS): 150 ADITIVO (DIAS):

EMPRESA CONTRATADA: PROPRIETÁRIO: CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA

CNPJ: CPF: 025.963.222-22

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA: 025.963.222-22

CONTRATO R\$: 141.049,87

ADITIVO R\$: 63.825,34

C. ADITADO R\$: 204.875,21

DATA FINAL: 28/04/2022

P. RESTANTE DIAS: 62

SALDO R\$: 64.460,02

À 25/02/2022

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 07/02/2022

FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA

MATRÍCULA: 608-4

ENGENHEIRO FISCAL: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

CREA/RPN: 160.686.136-1

CREA/RPN: 160.991.108-3 PE20220724641

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE PROGRAMADA			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.049,04	0,00	1.049,04	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	174,84	6,00	0,00	6,00	1.049,04	0,00	1.049,04	100,00%
2.0	DEMOLIÇÃO/RETIRADAS/REMOÇÕES						2.744,05	0,00	2.744,05	
2.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL	m²	31,09	62,48	0,00	62,48	1.942,50	0,00	1.942,50	100,00%
2.2	REMOÇÕES-RETIRADA E REMOÇÃO DE MEIO-FIO	m	13,79	25,82	0,00	25,82	356,05	0,00	356,05	100,00%
2.3	REMOÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO-CAMINHO DE CARRETEIRO	m²	35,64	12,50	0,00	12,50	445,50	0,00	445,50	100,00%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA						2.421,44	0,00	2.421,44	
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATÉ 1,50m	m³	54,80	37,68	0,00	37,68	2.064,86	0,00	2.064,86	100,00%
3.2	ATERRO/REATERRO COM TRANSPORTE ATÉ 1km MATERIAL GERAL	m³	8,70	14,80	0,00	14,80	128,76	0,00	128,76	100,00%
3.3	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	m³	46,40	4,91	0,00	4,91	227,82	0,00	227,82	100,00%
4.0	PISOS INTERNOS E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS						14.603,22	6.435,67	14.603,22	
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	m²	86,51	149,61	65,88	149,61	12.942,75	5.699,27	12.942,75	100,00%

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.02.25 10:11:10 -03'00'

ITE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE REPROGRAMADA			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	TEMPO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
4.2	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	und	24,14	38,28	0,00	38,28	924,07	0,00	924,07	100,00%
4.3	RAMPA DE PLANO INCLINADO L=1,00m COM BASE CONCRETO ESPES. 15cm	m	203,99	3,61	3,61	3,61	736,40	736,40	736,40	100,00%
5.0	REVESTIMENTO						9.652,75	0,00	9.652,74	
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	m²	125,60	61,93	0,00	61,93	7.778,40	0,00	7.778,39	100,00%
5.2	PASTILHA 5 x 5cm DE PORCELANA PA0010082 DR 601 BEGE AVARE NGK	m²	79,88	5,23	0,00	5,23	417,77	0,00	417,77	100,00%
5.3	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro	m²	3,51	61,93	0,00	61,93	217,37	0,00	217,37	100,00%
5.4	EMBOCO ESPESSURA 2,5cm- CIMENTO/AREIA/CAL 1:1:8	m²	20,01	61,93	0,00	61,93	1.239,21	0,00	1.239,21	100,00%
5.5	REBOCO PRONTO PREFABRICADO 2,5mm PAREDES C/EMBOCO DESEMPENADO	m²	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CANCELADO
6.0	HIDROSANITARIO						9.329,91	0,00	7.679,96	
6.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	und	329,99	9,00	0,00	4,00	2.969,91	0,00	1.319,96	44,44%
6.2	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	m	106,00	60,00	0,00	60,00	6.360,00	0,00	6.360,00	100,00%
7.0	PINTURA						35.886,77	13.655,51	20.345,18	
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	m²	16,56	1.564,17	625,67	625,67	25.902,65	10.361,06	10.361,06	40,00%
7.2	ESCOVAMENTO E LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO EM FACHADAS	m²	11,39	876,57	289,24	876,57	9.984,12	3.294,45	9.984,12	100,00%
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						129.188,03	35.074,40	81.919,56	
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	81,65	89,07	0,00	89,07	7.272,56	0,00	7.272,56	100,00%

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA
 07963031429

Assinado de forma digital
 por ÍTALO HENRIQUE
 CAVALCANTE DE
 ALMEIDA 07963031429
 Dados: 2022.02.25
 10:11:25 -03'00'

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE REPROGRAMADA			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
8.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	m²	254,20	438,95	126,50	253,00	111.581,08	32.156,30	64.312,60	57,64%
8.3	CONCRETO fck=25MPa APLICADO EM PILARES DE ESTRUTURAS	m³	955,49	0,44	0,00	0,44	420,41	0,00	420,41	100,00%
8.4	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m²	325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CANCELADO
8.5	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m²	503,99	8,94	5,79	8,94	4.505,66	2.918,10	4.505,67	100,00%
8.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	25,90	178,14	0,00	178,14	4.613,82	0,00	4.613,82	100,00%
8.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	4,46	178,14	0,00	178,14	794,50	0,00	794,50	100,00%
TOTAL							204.875,21		140.415,19	68,54%

É OBRIGATORIO O CARIMBO.

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.02.25 10:11:34 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO



BM 004

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DE ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL PAULO VIANA DE QUEIROZ, NO MUNICÍPIO DE FERREIROS

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE			OBSERVAÇÕES
				PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO	MEMÓRIA	
4.0	PISOS INTERNOS E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS						
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	86,51	83,76	65,88	(6,7x3,9)+(4,9x6)+(14,7x6,4)-83,73	Total reprogramado - quantidade medida nos bm's anteriores
4.3	RAMPA DE PLANO INCLINADO L=1,00m COM BASE CONCRETO ESPESS. 15cm	m	203,99	3,61	3,61	3,61	Quantidade de projeto
7.0	PINTURA						
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	16,56	1.564,17	625,67	40,00% do total	Serviço em execução
7.2	ESCOVAMENTO E LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO EM FACHADAS	m²	11,39	876,57	289,24	Total reprogramado - quantidade medida nos bm's anteriores	Serviço concluído
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
8.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	254,20	438,95	126,50	46,00 x 5,50 x 50,00%	Pagos os 50% do serviço
8.5	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	503,99	8,94	5,79	Total reprogramado - quantidade medida nos bm's anteriores	Serviço concluído

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por ÍTALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.02.25 10:11:44 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DE ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL PAULO VIANA DE QUEIROZ, NO MUNICÍPIO DE FERREIROS

VISÃO GERAL DA OBRA

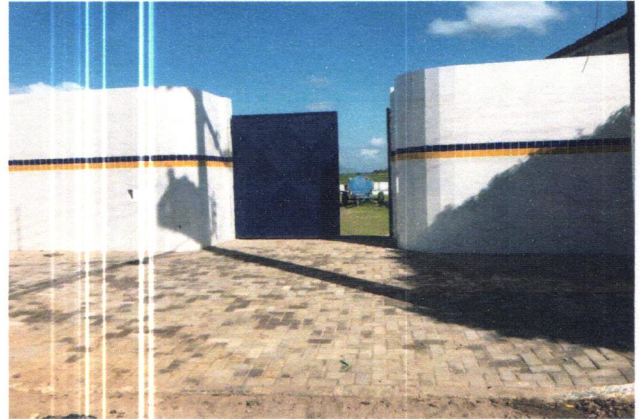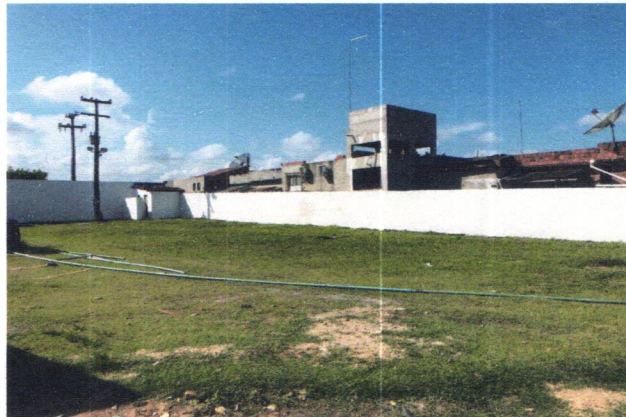

É OBRIGATORIO O CARIMBO:

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.02.25 10:11:56 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO
