

BOLETIM DE MEDIÇÃO

003



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 14/06/2023

VALOR DA MEDIÇÃO: 76.415,44

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

CONTRATO: 069/PMF/2022 MODALIDADE: TP 004/2022 PRAZOS DE EXEC.: 18/04/2023 15/09/2023

ORDEN DE SERVIÇOS: 18/04/2023 PRAZO (DIAS): 150 ADITIVO (DIAS): - C. ADITADO R\$: 434.057,60

EMPRESA CONTRATADA: CAM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME PROPRIETÁRIO: CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA

DATA FINAL: 15/09/2023

CNPJ: 17.331.335/0001-95 CPF: 023.498.134-28
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ADRIANA NUNES DOS SANTOS CREA: 181.894.289-5 PE20230907706

P. RESTANTE DIAS: 83
SALDO R\$: 210.034,41

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/06/2023 A 14/06/2023

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA
FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA
ENGENHEIRO FISCAL: ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

MATRÍCULA: 608-4
CREAR/PPN: 160.666.136-1
CREAR/PPN: 160.991.108-3 PE20230941711

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			VALOR PREVISTO	FINANCEIRO		
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO		MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26	M2	266,81	8,00	8,00	8,00	36.595,40	7.932,84	19.498,86	100,00%
1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	0,09	4.253,33	732,96	2.188,95	382,79	65,96	197,00	51,46%
1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO S DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M2	10,00	1.276,00	219,88	656,69	12.760,00	2.198,90	6.566,90	51,46%
1.4	OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	M2	800,01	12,00	2,00	6,00	9.600,12	1.600,02	4.800,06	50,00%
1.5	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,59	200,00	33,00	99,00	11.718,00	1.933,47	5.800,41	49,50%
2.0	PAVIMENTAÇÃO						397.462,20	68.482,60	204.524,32	
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF 06/2016	M	51,48	1.442,06	248,30	741,62	74.251,66	12.784,97	38.186,01	51,43%

Mat. 608-4

Claudsonor Manoel de Oliveira
SecI de Obris e Urbanismo

Italo Henrique Cavalcante de Almeida
Engenheiro Civil
CREA RN 160 991 108-3

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			VALOR PREVISTO	FINANCEIRO		
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO		MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	75,99	4.253,33	732,96	2.188,95	323.210,54	55.697,63	166.388,31	51,46%
TOTAL							434.057,60	76.419,44	224.023,19	51,61%

É OBRIGATORIO O CARIMBO.

Ital Henrique Cavalcante de Almeida
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

[Assinatura]
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 GESTOR DE CONTRATO

[Assinatura]
 C&M CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
 RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Ital Henrique Cavalcante de Almeida
 Engenheiro Civil
 REA: RN 160.991.108-3

MEMORIAL DE CÁLCULO

BM 003



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	MEMÓRIA	OBSERVAÇÕES
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26	M2	266,81	8,00	8,00	8,00	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransferGov - Rua Proletada 06
1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF - 11/2019	M2	0,09	4.253,33	732,96	732,96	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransferGov - Rua Proletada 06
1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF - 11/2019	M2	10,00	1.276,00	219,89	219,89	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransferGov - Rua Proletada 06
1.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF 02/2016	M2	800,01	12,00	2,00	2,00	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransferGov - Rua Proletada 06
1.5	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	58,59	200,00	33,00	33,00	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransferGov - Rua Proletada 06
2.0	PAVIMENTAÇÃO						
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X16X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	51,49	1.442,06	248,30	248,30	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransferGov - Rua Proletada 06
2.2	REJUNTAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	75,99	4.253,33	732,96	732,96	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransferGov - Rua Proletada 06
E OBRIGATÓRIO O CARIMBO.							

Henrique Cavalante de Almeida
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

[Assinatura]
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 GESTOR DE CONTRATO

[Assinatura]
 C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
 RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Henrique Cavalante de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA RN 160.991.108-3

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO PARÁ SEDE DESTE MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE


PLACA DA OBRA




RUJA PROJETADA 06




5 de jun. de 2023 14:07:33
-7°26'52" S -35°15'14" W
85A PE-082
Ferreiros
Pernambuco

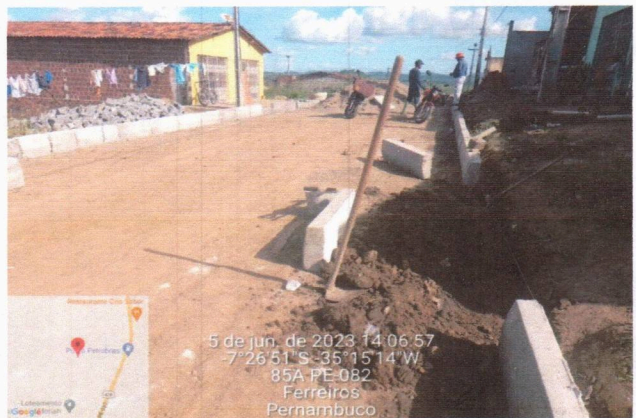

5 de jun. de 2023 14:06:57
-7°26'51" S -35°15'14" W
85A PE-082
Ferreiros
Pernambuco

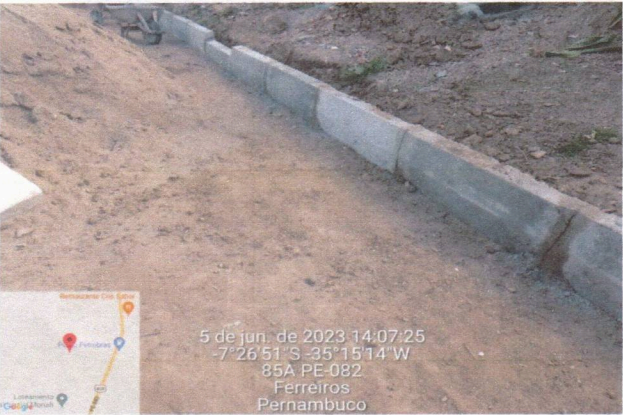

5 de jun. de 2023 14:07:25
-7°26'51" S -35°15'14" W
85A PE-082
Ferreiros
Pernambuco

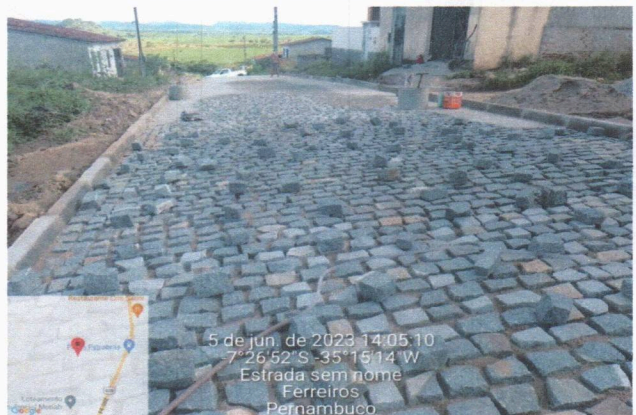

5 de jun. de 2023 14:05:10
-7°26'52" S -35°15'14" W
Estrada sem nome
Ferreiros
Pernambuco







5 de jun. de 2023 14:14:18
-7°26'52" S -35°15'15" W
Estrada sem nome
Ferreiros
Pernambuco



5 de jun. de 2023 14:04:56
-7°26'52" S -35°15'14" W
Estrada sem nome
Ferreiros
Pernambuco

talo Henrique Cavalcante de Almeida
Engenheiro Civil
CREA RN 160 991 108-3

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO PARÁ SEDE DESTE MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

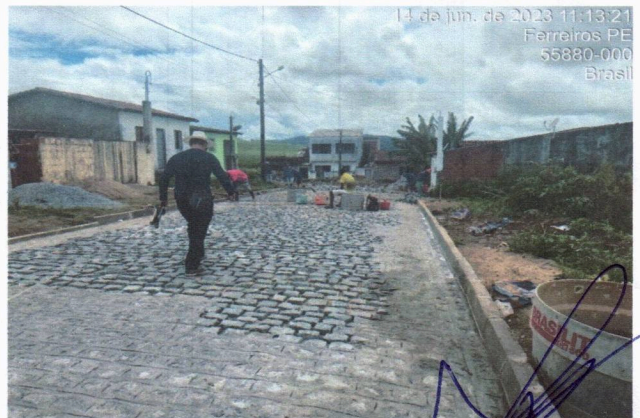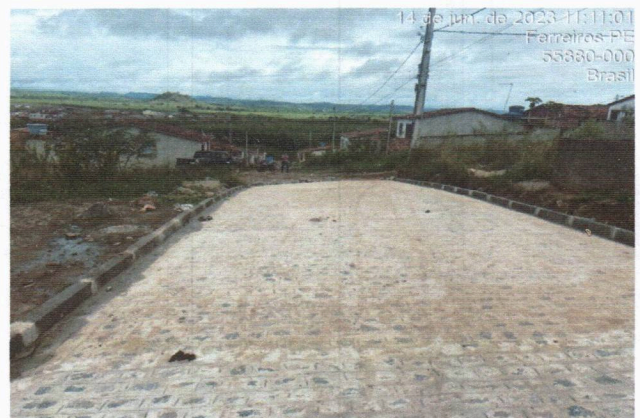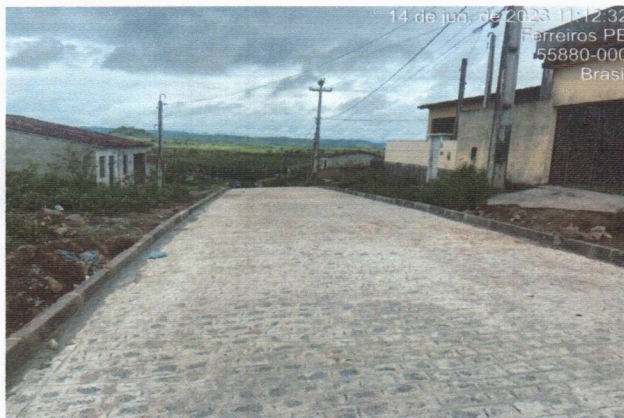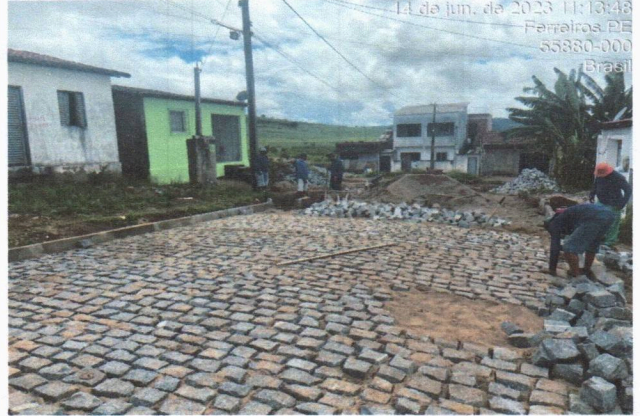

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

Italo H C Almeida
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

[Signature]
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 GESTOR DE CONTRATO

[Signature]
 C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
 RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Italo Henrique Cavalcante de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA RN 160 991 108-3
