


BOLETIM DE MEDIÇÃO

002

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 29/02/2024

VALOR DA MEDIÇÃO: 27.899,69



OBJETO: correta, reformas e adequações com fornecimento de insumos, equipamentos, peças e mão-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas Orçamentárias - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TRAVASSOS

CONTRATO: 101/2023 MODALIDADE: Pregão Eletrônico PRAZOS DE EXEC.: 17/11/2023 17/11/2024

ORDEN DE SERVIÇOS: 17/11/2023 PRAZO (DIAS): 365 ADITIVO (DIAS): -

EMPRESA CONTRATADA: COESA COMERCIO E ENGENHARIA EPP PROPRIETÁRIO: SÉRGIO ARAÚJO MONTEIRO

CNPJ: 09.926.171/0001-10 CPF: 653.464.084-87

RESPONSÁVEL TÉCNICO: SÉRGIO ARAÚJO MONTEIRO CREA: 180.157.618-1 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 12/12/2023

SALDO R\$: 170.028,12

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA
FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA
ENGENHEIRO FISCAL: ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA
CNO: 90.017.46657778

MATRÍCULA: 608-4
CREAR/PPN: 180.666.136-1
CREAR/PPN: 180.991.108-3

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE | | | VALOR PREVISTO | FINANCEIRO | | |
|------|--|-----|----------------|------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | QUANTIDADE | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADA ATÉ O PERÍODO | | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADA ATÉ O PERÍODO | ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%) |
| 1.0 | REGUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TRAVASSOS | M2 | 405,17 | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 210.745,83 | 27.899,69 | 40.717,77 | 100,00% |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 405,17 | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 911,63 | 0,00 | 911,63 | 100,00% |
| 1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 102,95 | 36,00 | 4,75 | 6,96 | 3.706,20 | 489,21 | 716,03 | 19,32% |
| 1.3 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 37,23 | 72,00 | 9,50 | 13,91 | 2.680,56 | 353,83 | 517,88 | 19,32% |
| 1.4 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M2 | 28,56 | 109,61 | 66,42 | 109,62 | 3.130,46 | 1.896,81 | 3.130,60 | 100,00% |
| 1.5 | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO | M2 | 10,97 | 288,70 | 173,80 | 288,70 | 3.167,03 | 1.906,58 | 3.167,03 | 100,00% |
| 1.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016 | M | 60,34 | 364,60 | 49,00 | 200,00 | 21.999,96 | 2.956,66 | 12.068,00 | 54,85% |
| 1.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022 | M2 | 64,42 | 305,90 | 160,00 | 160,00 | 19.706,07 | 10.307,20 | 10.307,20 | 52,30% |
| 1.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022 | M2 | 70,71 | 504,64 | 140,00 | 140,00 | 35.683,09 | 9.899,40 | 9.899,40 | 27,74% |
| 1.9 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 05/2022 | M2 | 18,44 | 27,69 | 0,00 | 0,00 | 510,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA: 079630314

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA: 07963031429


SERGIO ARAUJO MONTEIRO: 65346408487

Mat. 608-4

Assinado digitalmente por SERGIO ARAUJO MONTEIRO: 65346408487

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE | | | | FINANCEIRO | | | |
|------|---|-----|----------------|------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | QUANTIDADE | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADA ATÉ O PERÍODO | VALOR PREVISTO | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADA ATÉ O PERÍODO | ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%) | |
| 1.10 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO 40 x 40 x 2,5cm, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF 05/2023 | M2 | 159,94 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 742,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.11 | BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TUIOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS | M | 269,55 | 61,90 | 0,00 | 0,00 | 16.685,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 12/2021 | M2 | 145,85 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.13 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 10/2022 | M2 | 4,07 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 146,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.14 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014 | M2 | 38,56 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 1.388,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.15 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF 06/2014 | M2 | 10,04 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 361,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.16 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014 | M2 | 14,90 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 536,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.17 | BRINQUEDO - BALANÇO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, 02 LUGARES, COM ASSENTO DE MADEIRA, CORRENTE REVESTIDA C/MANGUEIRA PLÁSTICA TRANSP., FIXADO EM TUBO FERRO GALV, 4" | UN | 3.574,05 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3.574,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.18 | BRINQUEDO - LABIRINTO (TREPA-TREPA) EM TUBO FERRO GALV D=1 1/2" NA HORIZONTAL E D=1 1/2" NA VERTICAL, DIM:1,54X1,54X2,04M, REF: SERGIPARK OU SIMILAR | UN | 3.876,83 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3.876,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.19 | BRINQUEDO - GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" E 4" E ASSENTO DE MADEIRA, COM 03 PRANCHAS | UN | 4.920,13 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.20 | ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA | UN | 2.759,68 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 5.519,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.21 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 80 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF 11/2021 | UN | 1.266,16 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3.798,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.22 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADÊMIA DA TERCEIRA IDADE - ATÍ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF 10/2021 | UN | 5.833,09 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5.833,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
 DE ALMEIDA:07963031429
 Dados: 2024.02.29 08:56:18
 -03'00"


Claudionor Maribel de Oliveira
 Sec. de Obras e Urbanismo
 Mat. 608-4


Assinado digitalmente por **SERGIO ARAUJO MONTEIRO**
 DE ALMEIDA:07963031429
 Dados: 2024.02.29 08:56:18
 -03'00"

Assinado digitalmente por **SERGIO ARAUJO MONTEIRO**
 DE ALMEIDA:07963031429
 Dados: 2024.02.29 08:56:18
 -03'00"

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE | | | FINANCEIRO | | | |
|------|---|-----|----------------|------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | QUANTIDADE | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADA ATÉ O PERÍODO | VALOR PREVISTO | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADA ATÉ O PERÍODO | ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%) |
| 1.23 | INSTALAÇÃO DE MULTEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.AF.10/2021 | UN | 6.153,95 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 12.307,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.24 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.AF.10/2021 | UN | 3.886,68 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3.886,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.25 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.AF.10/2021 | UN | 4.623,87 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 9.247,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.26 | EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.AF.10/2021 | UN | 4.972,42 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4.972,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.27 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M.AF.12/2020 | UN | 116,07 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.28 | EMBUITR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF.10/2020 | UN | 122,42 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 122,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.29 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF.10/2020 | UN | 167,17 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 167,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.30 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF.10/2020 | UN | 167,17 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 167,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.31 | RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF.08/2020 | UN | 28,95 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 28,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.32 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF.12/2015 | UN | 15,02 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 15,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.33 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF.12/2015 | UN | 19,08 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 38,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.34 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF.12/2015 | UN | 10,48 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 83,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:079630314

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2020.02.29 08:56:31
-03'00"


Manoel de Oliveira
Sec. de Obras e Urbanismo
Mat. 608-4

SERGIO ARAUJO
MONTIEIRO:
65346408487

Assinado eletronicamente por SERGIO ARAUJO
MONTIEIRO:65346408487
Dados: 2020.02.29 13:26:00
-03'00"

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE | | | FINANCEIRO | | | |
|------|---|-----|----------------|------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | QUANTIDADE | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADA ATÉ O PERÍODO | VALOR PREVISTO | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADA ATÉ O PERÍODO | ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%) |
| 1.35 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 10,69 | 13,76 | 0,00 | 0,00 | 147,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.36 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 12,47 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.37 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 13,43 | 12,77 | 0,00 | 0,00 | 171,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.38 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 9,54 | 116,51 | 0,00 | 0,00 | 1.111,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.39 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 7,80 | 42,12 | 0,00 | 0,00 | 328,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.40 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 7,46 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 14,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.41 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 9,53 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 38,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.42 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 5,95 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 95,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.43 | POSTE DE AÇO CONICO CONTINUDO CURVO DUPLIO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 | UN | 2.635,44 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 15.812,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.44 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019 | UN | 591,67 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2.366,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.45 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020 | UN | 680,27 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 8.163,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.46 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020 | UN | 322,85 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.47 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020 | UN | 48,09 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 528,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.48 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 AF 12/2020 | UN | 11,71 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 128,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.49 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | UN | 136,69 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 1.503,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.50 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 13,03 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 39,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
 DE ALMEIDA:07963031429
 Dados: 2024.02.23 15:56:40 -03'00'

Claudio Nori Marinho de Oliveira
 Sec. de Obras e Urbanismo
 Mat. 608-4

SERGIO ARAUJO MONTENIRO:
 65346408487

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE | | | FINANCEIRO | | | | |
|--------------|---|-----|----------------|------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | QUANTIDADE | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADA ATÉ O PERÍODO | VALOR PREVISTO | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADA ATÉ O PERÍODO | ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%) | |
| 1.51 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 4,10 | 797,99 | 0,00 | 0,00 | 3.271,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.52 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | M | 33,88 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 372,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| TOTAL | | | | | | | | 210.745,83 | 27.809,69 | 40.717,77 | 19,32% |

É OBRIGATORIO O CARIMBO.

| | |
|---|--|
| <p>ITALIO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429</p> <p>Assinado de forma digital por ITALIO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429 Dados: 2024.02.29 08:56:57 -03'00'</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</p> | <p>Claudionor Manoel de Oliveira Sec. de Obras e Urbanismo Mat. 608-4</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS GESTOR DE CONTRATO</p> |
| <p>SERGIO ARAUJO MONTENHO: 65346408487</p> <p>COESA COMÉRCIO E ENGENHARIA EPP RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO</p> | <p><small>Este documento foi assinado digitalmente por SERGIO ARAUJO MONTENHO. Para validar esta assinatura é necessário utilizar o software de validação de assinaturas digitais disponível no portal de acesso ao GOV.BR. O sistema de validação de assinaturas digitais não é uma garantia de autenticidade das informações. A validade das assinaturas digitais depende de diversos fatores, incluindo a segurança do sistema de assinatura digital e a integridade das informações.</small></p> |

MEMORIAL DE CÁLCULO



BM 002

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia em condições preventivas, corretivas, reformas e adequações com fornecimento de insumos, equipamentos, peças e mão-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas Orçamentárias - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TRAVASSOS

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

OBSERVAÇÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | PREVISTA | QUANTIDADE | | OBSERVAÇÕES |
|------|---|---------|----------------------|----------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | MEDIDO NO PERÍODO | EVOLUÇÃO (%) | |
| 1 | REGUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TRAVASSOS | | | | | | |
| 1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 102,85 | 36,00 | % BM ANTERIOR 6,12% | % BM ATUAL 19,32% | De acordo com a evolução da obra |
| | | | | | Total item 1,2 | 4,75 | |
| 1.3 | ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 37,23 | 72,00 | % BM ANTERIOR 6,12% | % BM ATUAL 19,32% | De acordo com a evolução da obra |
| | | | | | Total item 1,3 | 9,50 | |
| | | | | | TOTAL | 66,42 | Área medida no autocid |
| 1.4 | DEMOIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M2 | 28,56 | 109,61 | COMPRIMENTO 35,90 | LARGURA 1,85 | |
| | | | | | Total item 1,4 | 66,42 | |
| | | | | | TOTAL | 173,80 | |
| 1.5 | DEMOIÇÃO DE MEO-CHÃO GRANÍTICO OU PREMOIADO | M2 | 10,97 | 288,70 | COMPRIMENTO 173,80 | | Serviço em execução |
| | | | | | Total item 1,5 | 173,80 | |
| | | | | | TOTAL | 49,00 | Serviço em execução |
| 1.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEO-CHÃO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 09/2018 | M | 60,34 | 364,60 | COMPRIMENTO 49,00 | | Serviço em execução |
| | | | | | Total item 1,6 | 49,00 | |
| 1.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022 | M2 | 64,42 | 305,90 | COMPRIMENTO 80,00 | LARGURA 2,00 | Serviço em execução |
| | | | | | Total item 1,7 | 160,00 | |
| 1.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022 | M2 | 70,71 | 504,64 | COMPRIMENTO 70,00 | LARGURA 2,00 | Serviço em execução |
| | | | | | Total item 1,8 | 140,00 | |

É OBRIGATORIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2025.02.28 08:57:13 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Manoel de Oliveira
Sua de Ocas e Usagem
Mat. 606-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

SERGIO ARAUJO MONTEIRO:65346408487




Assinado de forma digital por SERGIO ARAUJO MONTEIRO:65346408487
Dados: 2025.02.28 08:57:13 -03'00'

COESA COMÉRCIO E ENGENHARIA EPP
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia em conduções preventiva, corretiva, reformas e adequações com fornecimento de insumos, equipamentos, peças e mão-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas Orçamentárias - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TRAVASSOS

VISÃO GERAL DA OBRA

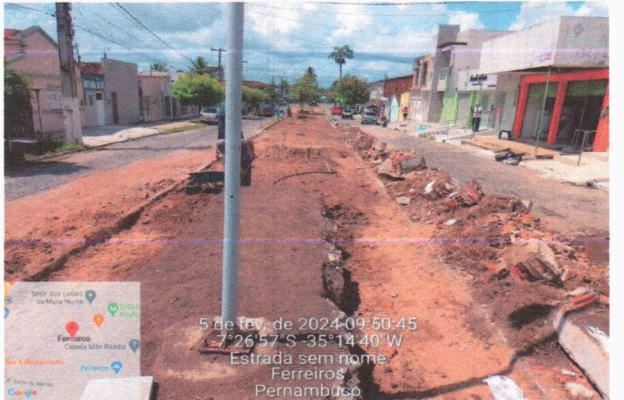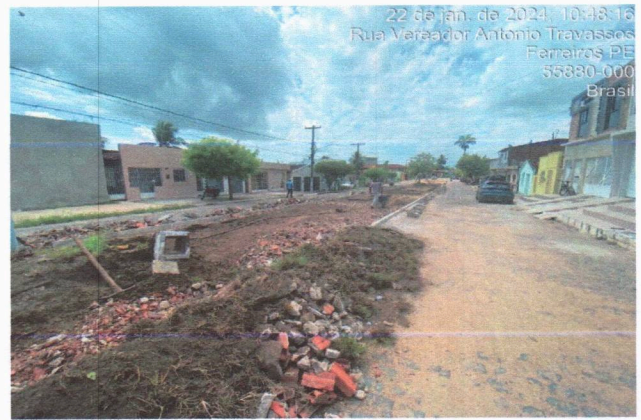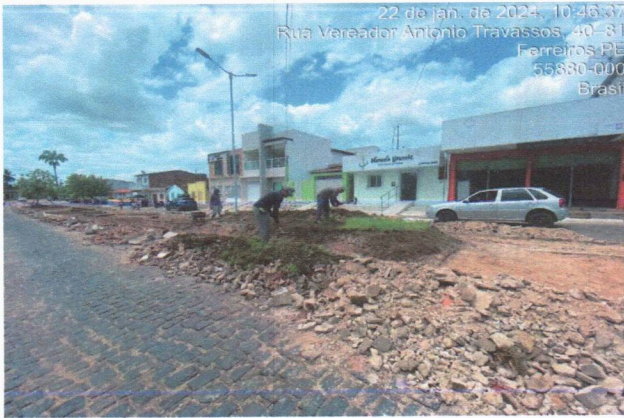

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.02.29 08:57:32 -03'00'

Claudionor Manoel de Oliveira
Sec. de Obras e Urbanismo
Mat. 608-4

SERGIO ARAUJO MONTEIRO: 65346408487


Assinado digitalmente por SERGIO ARAUJO MONTEIRO:65346408487
DN: c=BR, o=CIP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiple vs, ou=2885257000175, ou=Presencial, ou=Certificado PF_A0, cn=SERGIO ARAUJO MONTEIRO, o=CIP-Brasil
Razão: Eu sou o autor deste documento
Licenciamento: sua utilização de assinatura aqui
Data: 2024.02.29 13:37:29
Foxit PhantomPDF Versão: 8.1.1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS


Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia em conduções preventiva, corretiva, reformas e adequações com fornecimento de insumos, equipamentos, peças e mão-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas Orçamentárias - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TRAVASSOS




5 de fev. de 2024 09:53:16
7°26'58" S - 35°14'41" W
50 Rua Vereador Antônio Travassos
Ferreiros
Pernambuco

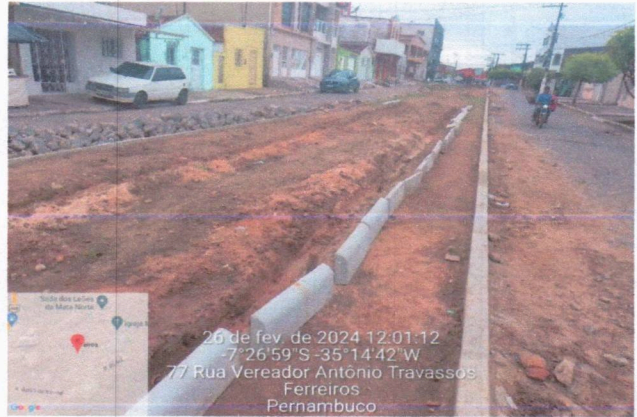

26 de fev. de 2024 12:01:12
7°26'59" S - 35°14'42" W
77 Rua Vereador Antônio Travassos
Ferreiros
Pernambuco

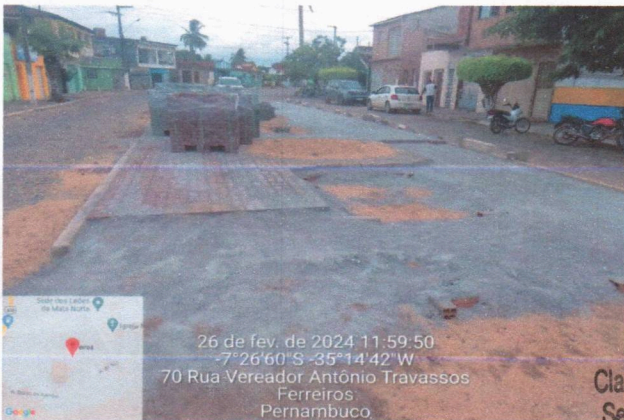

26 de fev. de 2024 11:59:50
7°26'60" S - 35°14'42" W
70 Rua Vereador Antônio Travassos
Ferreiros
Pernambuco

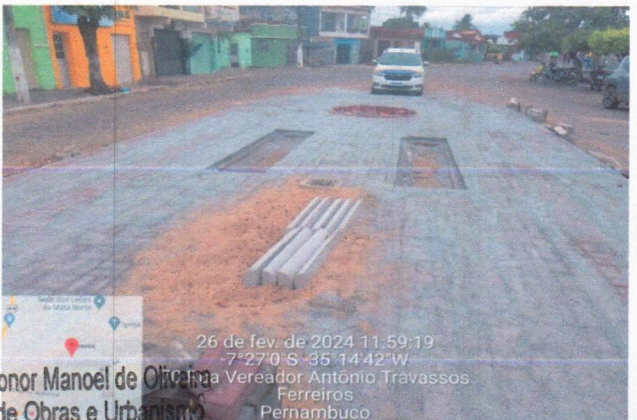

26 de fev. de 2024 11:59:19
7°27'0" S - 35°14'42" W
70 Rua Vereador Antônio Travassos
Ferreiros
Pernambuco

Claudionor Manoel de Oliveira
Sec. de Obras e Urbanismo

Mat. 608-4

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por ITALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.02.29 08:57:44 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

SERGIO ARAUJO
MONTEIRO:
65346408487

Assinado eletronicamente no sistema e-SIC no dia 29/02/2024 às 08:57:44.
CPF: 07963031429
Assinado eletronicamente no sistema e-SIC no dia 29/02/2024 às 08:57:44.
CPF: 07963031429

COESA COMÉRCIO E ENGENHARIA EPP
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO
