

BOLETIM DE MEDIÇÃO

003

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 29/03/2024

VALOR DA MEDIÇÃO: 33.830,96



Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia em conduções preventiva, corretiva, reformas e adequações com fornecimento de insumos, equipamentos, peças e mão-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas Orçamentárias - REGUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TRAVASSOS

OBJETO:

corretiva, reformas e adequações com fornecimento de insumos, equipamentos, peças e mão-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas Orçamentárias - REGUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TRAVASSOS

CONTRATO:

10/1/2023 MODALIDADE: Pregão Eletrônico 003/2023

17/11/2024

ORDEN DE SERVIÇOS:

17/11/2023 PRAZO (DIAS): 365

ADITIVO (DIAS): -

ADITIVO (DIAS): -

ADITIVO (DIAS): -

ADITIVO (DIAS): -

ADITIVO (DIAS): -

ADITIVO (DIAS): -

ADITIVO (DIAS): -

ADITIVO (DIAS): -

ADITIVO (DIAS): -

ADITIVO (DIAS): -

EMPRESA CONTRATADA: COESA COMERCIO E ENGENHARIA EPP

PROPRIETÁRIO: SÉRGIO ARAÚJO MONTEIRO

CPF: 653.464.084-87

DATA FINAL: 17/11/2024

CNPJ: 09.926.177/0001-10

CPF: 653.464.084-87

CREARPN: 160.991.108-3

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/02/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/02/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/02/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/02/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/02/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO: SÉRGIO ARAÚJO MONTEIRO

CREA: 190.157.616-1

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/02/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/02/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/02/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/02/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/02/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/02/2024

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA
FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA
ENGENHEIRO FISCAL: ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA
CNO: 90.017.48657/78

MATRÍCULA: 608-4
CREARPN: 160.666.136-1
CREARPN: 160.991.108-3

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/02/2024
SALDO R\$: 136.197,14

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE				VALOR PREVISTO	FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO		MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)	
1.0	REGUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TRAVASSOS											
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	405,17	2,25	0,00	2,25	210.745,83	33.830,96	74.548,75	911,63	100,00%	
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	102,95	36,00	5,78	12,73	3.706,20	594,84	1.310,88	594,84	35,37%	
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,23	72,00	11,56	25,47	2.680,56	430,22	948,11	948,11	35,37%	
1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	28,56	109,61	0,00	109,62	3.130,46	0,00	3.130,60	3.130,60	100,00%	
1.5	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRÁNTICO OU PRÉ-MOLDADO	M2	10,97	288,70	0,00	288,70	3.167,03	0,00	3.167,03	3.167,03	100,00%	
1.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF 06/2016	M	60,34	364,60	145,00	345,00	21.989,96	8.749,30	20.817,30	20.817,30	94,62%	
1.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF 10/2022	M2	64,42	305,90	110,00	270,00	19.706,07	7.086,20	17.393,40	17.393,40	88,26%	
1.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF 10/2022	M2	70,71	504,84	240,00	380,00	35.683,09	16.970,40	26.869,80	26.869,80	75,30%	
1.9	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURTIBANA, EM PLACAS, AF 05/2022	M2	18,44	27,69	0,00	0,00	510,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.10	PISO PODOBATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO 40 X 40 X 2,5cm, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF 05/2023	M2	159,94	4,64	0,00	0,00	742,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.11	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRILICA, 2 DEMÃOS	M	269,55	61,90	0,00	0,00	16.685,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA/07963031429
Dados: 2024.03.28 09:41:20 -03'00'

Claudionor Manoel de Oliveira
Sec. de Obras e Urbanismo
Mat. 608-4



Documento assinado digitalmente
SÉRGIO ARAÚJO MONTEIRO
Data: 01/04/2024 07:32:56-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE				FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)	
1.12	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	145,85	18,00	0,00	0,00	2.625,30	0,00	0,00	0,00%	
1.13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	4,07	36,00	0,00	0,00	146,52	0,00	0,00	0,00%	
1.14	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	38,56	36,00	0,00	0,00	1.386,16	0,00	0,00	0,00%	
1.15	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	10,04	36,00	0,00	0,00	361,44	0,00	0,00	0,00%	
1.16	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	14,90	36,00	0,00	0,00	536,40	0,00	0,00	0,00%	
1.17	BRINQUEDO - BALANÇO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, 02 LUGARES, COM ASSENTO DE MADEIRA, CORRENTE REVESTIDA C/MANGUEIRA PLÁSTICA TRANSP., FIXADO EM TUBO FERRO GALV. AF 11/2021	UN	3.574,05	1,00	0,00	0,00	3.574,05	0,00	0,00	0,00%	
1.18	BRINQUEDO - LABIRINTO (TREPA-TREPA) EM TUBO FERRO GALV. D=1 1/2" NA HORIZONTAL E D=1 1/2" NA VERTICAL. DIM:1,54X1,54X2,04M. REF: SERGIOPARK OU SIMILAR	UN	3.876,83	1,00	0,00	0,00	3.876,83	0,00	0,00	0,00%	
1.19	BRINQUEDO - GANÇORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" E 4" E ASSENTO DE MADEIRA, COM 03 PRANCHAS	UN	4.920,13	1,00	0,00	0,00	4.920,13	0,00	0,00	0,00%	
1.20	ESCOREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	2.759,68	2,00	0,00	0,00	5.519,36	0,00	0,00	0,00%	
1.21	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 80 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	UN	1.266,16	3,00	0,00	0,00	3.798,48	0,00	0,00	0,00%	
1.22	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	5.833,09	1,00	0,00	0,00	5.833,09	0,00	0,00	0,00%	
1.23	TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	6.153,95	2,00	0,00	0,00	12.307,90	0,00	0,00	0,00%	
1.24	SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	3.886,68	1,00	0,00	0,00	3.886,68	0,00	0,00	0,00%	
1.25	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	4.623,87	2,00	0,00	0,00	9.247,74	0,00	0,00	0,00%	

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.03.28 09:41:31
-03'00"

Sec. de Obrs e Urbanismo
Mar. 603-4



Documento assinado digitalmente
SERGIO ABALUJO MONTENHO
Data: 01/04/2024 07:34:47 -0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.26	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF. 10/2021	UN	4.972,42	1,00	0,00	0,00	4.972,42	0,00	0,00	0,00%
1.27	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, AF. 12/2020	UN	146,07	13,00	0,00	0,00	1.508,91	0,00	0,00	0,00%
1.28	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	122,42	1,00	0,00	0,00	122,42	0,00	0,00	0,00%
1.29	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	167,17	1,00	0,00	0,00	167,17	0,00	0,00	0,00%
1.30	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	167,17	1,00	0,00	0,00	167,17	0,00	0,00	0,00%
1.31	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2020	UN	28,95	1,00	0,00	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00%
1.32	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	15,02	1,00	0,00	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00%
1.33	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	19,08	2,00	0,00	0,00	38,16	0,00	0,00	0,00%
1.34	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	10,48	8,00	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	0,00%
1.35	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	10,69	13,76	0,00	0,00	147,09	0,00	0,00	0,00%
1.36	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	12,47	1,58	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00%
1.37	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	13,43	12,77	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00	0,00%
1.38	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	9,54	116,51	0,00	0,00	1.111,50	0,00	0,00	0,00%
1.39	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	7,80	42,12	0,00	0,00	328,53	0,00	0,00	0,00%
1.40	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	7,46	2,00	0,00	0,00	14,92	0,00	0,00	0,00%
1.41	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	9,53	4,00	0,00	0,00	38,12	0,00	0,00	0,00%
1.42	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	5,95	16,00	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00%

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.03.28 09:41:40 -03'00'




Documento assinado digitalmente
SERGIO ARAUJO MONTEIRO
Data: 01/04/2024 07:35:29-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UMD	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.43	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	UN	2.635,44	6,00	0,00	0,00	15.812,64	0,00	0,00	0,00%
1.44	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5* M, SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	UN	591,67	4,00	0,00	0,00	2.366,68	0,00	0,00	0,00%
1.45	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2020	UN	680,27	12,00	0,00	0,00	8.163,24	0,00	0,00	0,00%
1.46	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2020	UN	322,85	8,00	0,00	0,00	2.582,80	0,00	0,00	0,00%
1.47	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF. 12/2020	UN	48,09	11,00	0,00	0,00	528,99	0,00	0,00	0,00%
1.48	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 35 MM2	UN	11,71	11,00	0,00	0,00	128,81	0,00	0,00	0,00%
1.49	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2017	UN	136,69	11,00	0,00	0,00	1.503,59	0,00	0,00	0,00%
1.50	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	13,03	3,00	0,00	0,00	39,09	0,00	0,00	0,00%
1.51	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	4,10	797,99	0,00	0,00	3.271,75	0,00	0,00	0,00%
1.52	CORDALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2017	M	33,88	11,00	0,00	0,00	372,68	0,00	0,00	0,00%
TOTAL							210.745,83	33.830,96	74.548,75	35,37%

E OBRIGATORIO O CARIMBO.

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
 Dados: 2024.03.28 09:41:49 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 GESTOR DE CONTRATO

COESA COMÉRCIO E ENGENHARIA EPP
 RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO





gov.br

Documento assinado digitalmente
 SERGIO ARAUJO MONTEIRO
 Data: 01/04/2024 07:25:01 -0300
 Verifique em https://validar.it.gov.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia em conduções preventiva, corretiva, reformas e adequações com fornecimento de insumos, equipamentos, peças e mão-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas Orçamentárias - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TRAVASSOS

VISÃO GERAL DA OBRA

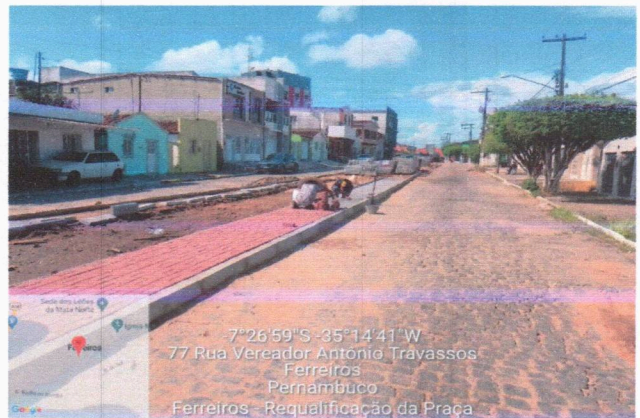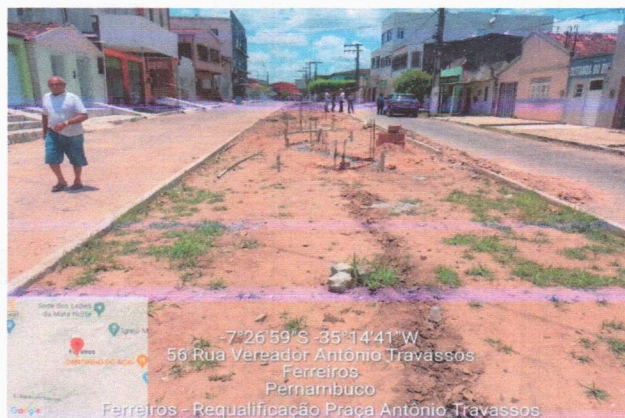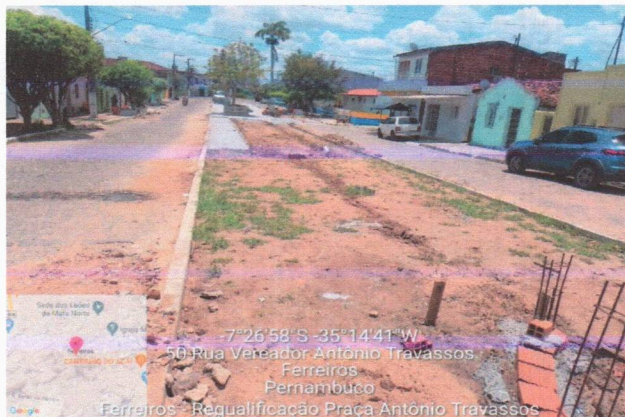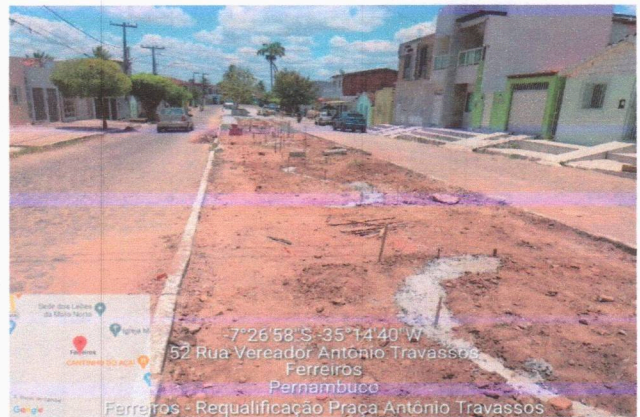


ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.03.28 09:42:09 -03'00'

Documento assinado digitalmente
SERGIO ARAUJO MONTEIRO
Data: 01/04/2024 07:31:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS


Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia em conduções preventiva, corretiva, reformas e adequações com fornecimento de insumos, equipamentos, peças e mão-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas Orçamentárias - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TRAVASSOS

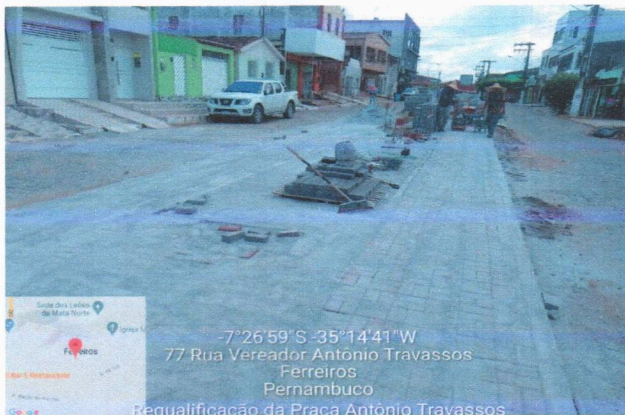


-7°26'59"S -35°14'41"W
77 Rua Vereador Antônio Travassos
Ferreiros
Pernambuco
Requalificação da Praça Antônio Travassos



7°26'58"S -35°14'41"W
61a Rua Vereador Antônio Travassos
Centro
Ferreiros
Pernambuco
Requalificação da Praça Antônio Travassos

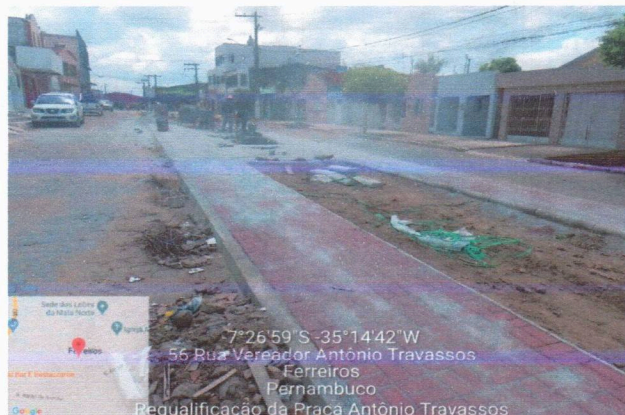

7°26'59"S -35°14'42"W
56 Rua Vereador Antônio Travassos
Ferreiros
Pernambuco
Requalificação da Praça Antônio Travassos

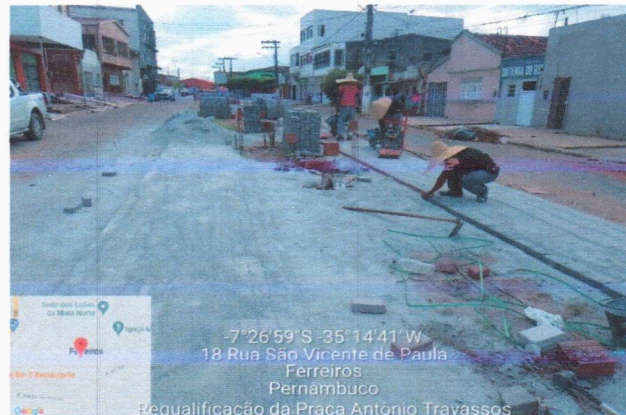

7°26'59"S -35°14'41"W
18 Rua São Vicente de Paula
Ferreiros
Pernambuco
Requalificação da Praça Antônio Travassos

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por ITALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429

CPF: 202403288994221-0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

CDESA COMÉRCIO E ENGENHARIA EPP
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

gov.br Documento assinado digitalmente
SERGIO ARAUJO MONTEIRO
Data: 01/04/2024 07:18:43-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>
