

BOLETIM DE MEDIÇÃO

003

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERREIROS
CIDADE DE ENCANTOS MIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 16/09/2025

VALOR DA MEDIÇÃO: 18.656,60

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NAS MARGENS DO RIACHO DO PARÁ, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE FERREIROS/PE, COM FOCO EM ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO

CONTRATO: 038/2025 MODALIDADE: DISPENSA Nº 006/2025

PRAZOS DE EXEC.: 01/04/2025 31/05/2025

ADITIVO R\$: 2.686,02

ORDEM DE SERVIÇOS: 01/04/2025 PRAZO (DIAS): 60

ADITIVO (DIAS): 120 -

C. ADITADO R\$: 68.386,01

EMPRESA CONTRATADA: MARTINS E CARDOSO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

PROPRIETÁRIO: FERNANDA GABRIELLA LIBERATO SANTOS

DATA FINAL: 28/09/2025

CNPJ: 29.663.765/0001-93

CPF: 083.257.064-81

P. RESTANTE
DIAS: 12

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TAIZA KARLA ALVES SOUZA

CREA: 181.744.350-0 PE20251339155

SALDO R\$: 0,00

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/07/2025

À 16/09/2025

GESTOR DE CONTRATO: CÉSAR MARCELINO DA SILVA

MATRÍCULA: 0543

FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIADO DE SOUSA

CREA/RPN: 160.666.136-1

ENGENHEIRO FISCAL: ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

CREA/RPN: 160.991.108-3 PE20251342889

CNO: 90.024.03409/72

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						12.081,92	2.242,40	12.081,92	
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	507,90	3,00	0,00	3,00	1.523,70	0,00	1.523,70	100,00%
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	9.224,22	1,00	0,24	1,00	9.224,22	2.242,40	9.224,22	100,00%
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	m²	4,45	300,00	0,00	300,00	1.334,01	0,00	1.334,01	100,00%
2	ARBORIZAÇÃO						46.719,99	16.414,20	46.719,99	
2.1	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CANCELADO
2.2	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	94,48	10,00	0,00	10,00	944,78	0,00	944,78	100,00%
2.3	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	57,77	10,00	0,00	10,00	577,74	0,00	577,74	100,00%
2.4	Planta - Agave gigantea (furcraea gigantea) - muda, fornecimento e plantio	un	157,94	5,00	0,00	5,00	789,70	0,00	789,70	100,00%
2.5	Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio	un	22,82	10,00	0,00	10,00	228,21	0,00	228,21	100,00%
2.6	Planta - Assistasia (acystasia coromandeliana), fornecimento e plantio	un	8,97	10,00	0,00	10,00	89,71	0,00	89,71	100,00%
2.7	Planta - Camaúba (copernicia prunifera), fornecimento e plantio	un	101,76	5,00	0,00	5,00	508,82	0,00	508,82	100,00%
2.8	Planta - Palmeira Vênia, fornecimento e plantio	un	511,86	10,00	0,00	10,00	5.118,57	0,00	5.118,57	100,00%
2.9	Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio	un	85,44	10,00	0,00	10,00	854,41	0,00	854,41	100,00%
2.10	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF 07/2024	m²	4,87	100,00	0,00	100,00	486,81	0,00	486,81	100,00%
2.11	Base com brita graduada, exclusive pó de pedra e transporte da brita)	m³	138,05	150,00	0,00	150,00	20.707,04	0,00	20.707,04	100,00%
2.12	Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/5 fios arame farpado	m	40,28	340,00	340,00	340,00	13.695,20	13.695,20	13.695,20	100,00%
2.13	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024	m²	27,19	100,00	100,00	100,00	2.719,00	2.719,00	2.719,00	100,00%
3	HIDRAULICA						9.584,09	0,00	9.584,09	
3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	10,31	300,00	0,00	300,00	3.093,83	0,00	3.093,83	100,00%

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2025.09.16 08:26:41
-03'00'César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 543

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
3.2	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO), AF_05/2024	UN	23,55	100,00	0,00	100,00	2.355,30	0,00	2.355,30	100,00%
3.3	Torneira de plástico para jardim (herc ref 1128) ou similar	un	2,77	8,00	0,00	8,00	22,18	0,00	22,18	100,00%
3.4	PONTO DE ÁGUA PARA TORNEIRA PARA JARDIM, INCLUSIVE TORNEIRA, TUBOS E CONEXÕES.	UN	64,53	2,00	0,00	2,00	129,05	0,00	129,05	100,00%
3.5	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM	M	6,49	50,00	0,00	50,00	324,35	0,00	324,35	100,00%
3.6	Irrigação diária	m2xd	0,12	30.000,00	0,00	30.000,00	3.659,37	0,00	3.659,37	100,00%
TOTAL							68.386,01	18.656,60	68.386,01	100,00%
É OBRIGATÓRIO O CARIMBO. ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429 Dados: 2025.09.16 08:26:51 -03'00' César Marcelino da Silva Secretário de Obras Matr. 543 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS GESTOR DE CONTRATO MARTINS E CARDOSO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO										

Documento assinado digitalmente



TAIZA KARLA ALVES SOUZA
Data: 06/10/2025 09:16:20 -0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

MEMORIAL DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERREIROS
CIDADE DE ENCANTOS MIL

BM 003

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NAS MARGENS DO RIACHO DO PARÁ, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE FERREIROS/PE,
COM FOCO EM ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDO NO PERÍODO				OBSERVAÇÕES
					% BM ANTERIOR	% BM ATUAL	EVOLUÇÃO (%)		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	9.224,22	1,00	75,89%	100,00%	24,31%	0,24	
								Total Item 1.2	0,24
2	ARBORIZAÇÃO								
2.12	Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,80m, c/5 fios arame farpado	m	40,28	340,00	COMPRIMENTO 340,00	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO 340,00	Vide projeto básico
								Total Item 2.12	340,00
					COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	REPETIÇÃO	
2.13	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024	m²	27,19	100,00	1,00	1,00		100,00	Vide projeto básico
								Total Item 2.13	100,00





É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429
Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
Data: 2025.09.16 09:27:00 -03'00'PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃOCésar Marcelino da Silva
Secretário de Obras
MAY 5/25
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATODocumento assinado digitalmente
TAIZA KARLA ALVES SOUZA
Data: 06/10/2025 09:15:09-0300
Verifique em <https://validar.lti.gov.br>MARTINS E CARDOSO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
TÉCNICO EXECUÇÃO



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NAS MARGENS DO RIACHO DO PARA, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE FERREIROS/PE, COM FOCO EM ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO

VISÃO GERAL DA OBRA

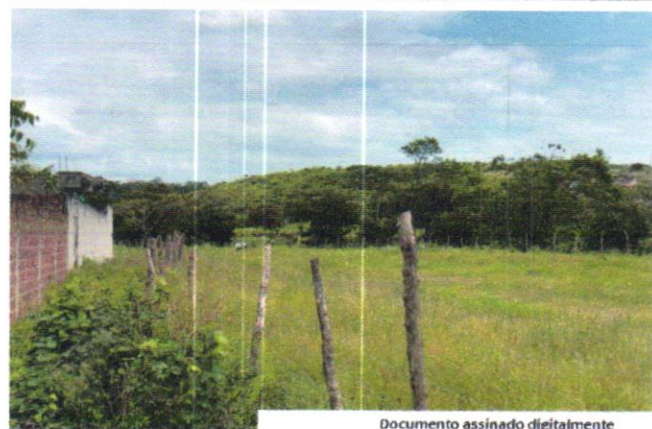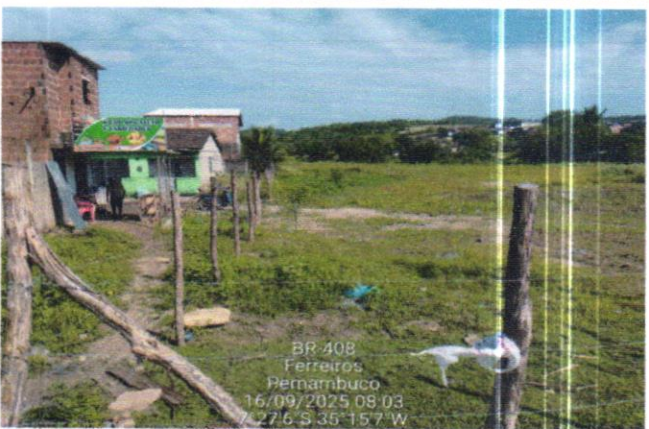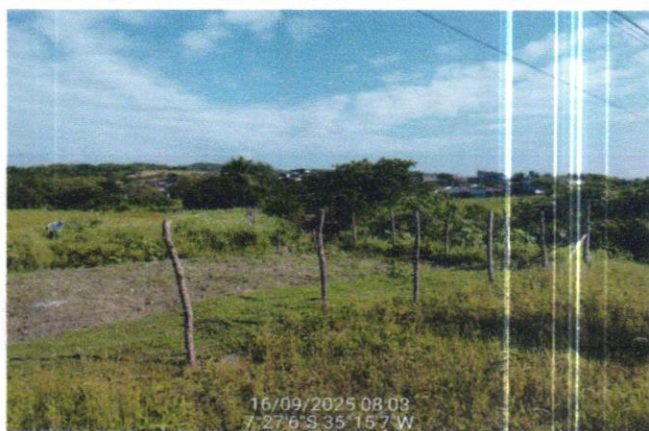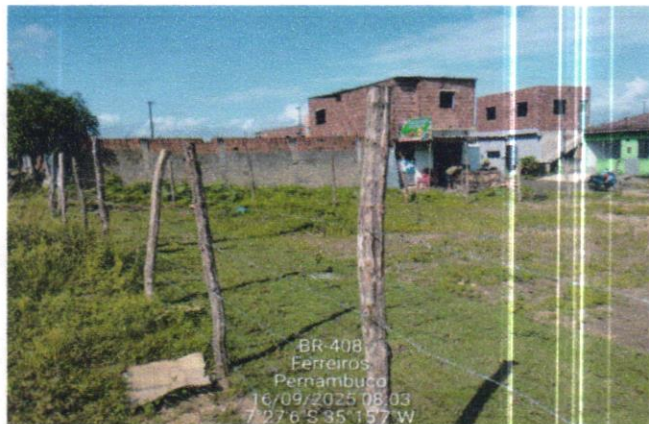

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2025.09.16 08:12:48-03'00"

César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RECTOR DE CONTRATO



Documento assinado digitalmente

TAIZA KARLA ALVES SOUZA

Data: 06/10/2025 09:14:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO
