

BOLETIM DE MEDIÇÃO

001



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 23/07/2025

VALOR DA MEDIÇÃO: 7.557,83

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE NOS SÍTIOS BARRA E

CONTRATO R\$: 92.000,00

CONTRATO: 013/2025

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA
001/2025

PRAZOS DE EXEC.: 13/06/2025 11/10/2025

ADITIVO R\$: 0,00

ORDEM DE SERVIÇOS: 13/06/2025

PRAZO (DIAS): 120

ADITIVO (DIAS): -

C. ADITADO R\$: 92.000,00

EMPRESA CONTRATADA:

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI
LTDA

REPRESENTANTE:

JOÃO BATISTA DA SILVA

DATA FINAL: 11/10/2025

CNPJ: 22.594.155/0001-36

CPF: 921.949.824-34

P. RESTANTE
DIAS: 80

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RONEY MARCOS LOURENÇO MOREIRA

CREA: 180.429.378-4

PE20251359382

SALDO R\$: 84.442,17

A 23/07/2025

GESTOR DE CONTRATO: CÉSAR MARCELINO DA SILVA

MATRÍCULA: 0543

CREA/RPN: 160.666.136-1

FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIADO DE SOUSA

CREA/RPN: 160.991.108-3 PE20251351044

ENGENHEIRO FISCAL: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

CNO: 90.024.71131/70

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.786,59	893,29	893,29	
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	397,02	4,50	2,25	2,25	1.786,59	893,29	893,29	50,00%
1	POSTO DE SAÚDE SÍTIO BARRA						44.764,41	0,00	0,00	
1	COBERTA						12.555,83	0,00	0,00	
1.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	20,11	165,45	0,00	0,00	3.327,19	0,00	0,00	0,00%
1.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	46,76	165,45	0,00	0,00	7.736,44	0,00	0,00	0,00%
1.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	124,35	12,00	0,00	0,00	1.492,20	0,00	0,00	0,00%
2	FORRO						7.692,91	0,00	0,00	
2.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	m²	54,44	141,31	0,00	0,00	7.692,91	0,00	0,00	0,00%
3	REVESTIMENTO CERÂMICO						11.354,95	0,00	0,00	
3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	58,15	195,27	0,00	0,00	11.354,95	0,00	0,00	0,00%
4	ESQUADRIAS						10.727,22	0,00	0,00	
4.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	523,26	13,00	0,00	0,00	6.802,38	0,00	0,00	0,00%

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429Assinado de forma digital por ÍTALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2025.07.23 09:52:14 -03'00'RONEY MARCOS
LOURENÇO
MOREIRA:0204215145Assinado digitalmente por RONEY MARCOS LOURENÇO
MOREIRA:0204215145
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PE A1, OU=Videoconferência, OU=261023410001517, OU=AC Synguard Multipia
CNA=JOÃO BATISTA DA SILVA:92194982434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:JOAO BATISTA
DA
SILVA:9219498243Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA
SILVA:92194982434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PE A1, OU=Videoconferência, OU=261023410001517, OU=AC Synguard Multipia
CNA=JOÃO BATISTA DA SILVA:92194982434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 543

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
4.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	505,68	5,00	0,00	0,00	2.528,40	0,00	0,00	0,00%
4.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	77,58	18,00	0,00	0,00	1.396,44	0,00	0,00	0,00%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.433,50	0,00	0,00	
5.1	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	m²	15,00	15,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m²	3,77	200,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00%
5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m²	5,83	100,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00%
5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m²	8,17	50,00	0,00	0,00	408,50	0,00	0,00	0,00%
5.5	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	m²	4,63	100,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00%
II	POSTO DE SAÚDE SÍTIO ARAÇA						45.449,00	6.664,54	6.664,54	
1	COBERTA						15.263,00	0,00	0,00	
1.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	20,11	179,90	0,00	0,00	3.617,78	0,00	0,00	0,00%
1.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	46,76	179,90	0,00	0,00	8.412,12	0,00	0,00	0,00%
1.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	124,35	26,00	0,00	0,00	3.233,10	0,00	0,00	0,00%
2	FORRO						6.664,54	6.664,54	6.664,54	
2.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	m²	54,44	122,42	122,42	122,42	6.664,54	6.664,54	6.664,54	100,00%
3	REVESTIMENTO CERÂMICO						10.996,74	0,00	0,00	
3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	58,15	189,11	0,00	0,00	10.996,74	0,00	0,00	0,00%
4	ESQUADRIAS						10.091,22	0,00	0,00	
4.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	523,26	10,00	0,00	0,00	5.232,60	0,00	0,00	0,00%
4.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	505,68	7,00	0,00	0,00	3.539,76	0,00	0,00	0,00%

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429

Assinado de forma digital por ITALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429
Dados: 2025.07.23 09:52:23 -03'00'

RONEY MARCOS
LOURENCO
MOREIRA:02042151

Assinado digitalmente por RONEY MARCOS
LOURENCO MOREIRA:02042151499
MD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, CN=Videconferência, OU=26102341008157, OUNAC Sympulid Multipla, CN=RONEY MARCOS
LOURENCO MOREIRA:02042151499
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:

JOAO BATISTA
DA
SILVA:9219498243

Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA
SILVA:92194982434
MD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Videconferência, OU=26102341008157, OUNAC Sympulid Multipla, CN=JOAO BATISTA DA SILVA:92194982434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.23 09:52:23 -03'00'

César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 543

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
4.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	77,58	17,00	0,00	0,00	1.318,86	0,00	0,00	0,00%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.433,50	0,00	0,00	
5.1	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	m²	15,00	15,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m²	3,77	200,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00%
5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m²	5,83	100,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00%
5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m²	8,17	50,00	0,00	0,00	408,50	0,00	0,00	0,00%
5.5	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	m²	4,63	100,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL							92.000,00	7.557,83	7.557,83	8,22%
É OBRIGATÓRIO O CARIMBO. Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429 Dados: 2025.07.23 09:52:31 -03'00' PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  César Marcelino da Silva Secretário de Obras Mat 543 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS GESTOR DE CONTRATO Assinado digitalmente por RONEY MARCOS LOURENCO MOREIRA:02042151459 ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, CN=Henrique Cavalcante de Almeida OU=Secretaria Municipal de Obras Roney: Eu sou o autor deste documento. Localização: Data: 2025.07.23 10:54:35-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2 RONEY MARCOS LOURENCO MOREIRA:02042151459 GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO										

JOAO BATISTA DA SILVA:9219498243

4

Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA SILVA:9219498243
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, CN=João Batista da Silva
OU=Videoconferencia, CN=JOAO BATISTA DA SILVA:9219498243
Roney: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2025.07.23 10:54:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

MEMORIAL DE CÁLCULO



BM 001

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE NOS SÍTIOS BARRA E ARAÇA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDICAÇÃO

[illegible]

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429

Assinado de forma digital por ITALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2025.07.23 09:52:43 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

 César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 543

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

[illegible]

**JOAO BATISTA DA
SILVA:9219498243**

Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA
SILVA.92104982434
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF
A1, OU=Videoconferencia, OU=26162341000157,
OU=AG Syngulard Múltipla, CN=JOAO BATISTA DA
SILVA.92104982434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.23 16:54:59-03'00'
Formato PDF: Open Versão: 2024.2.2



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE NOS SÍTIOS BARRA E ARAÇA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

PLACA DA OBRA




-7,4756S -35,2687W




-7,4756S -35,2686W

VISÃO GERAL DA OBRA

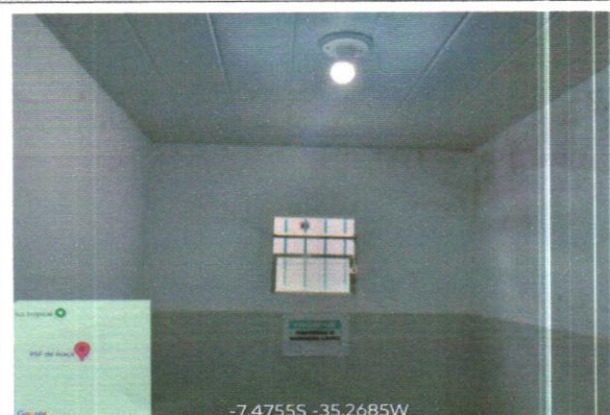


-7,4755S -35,2685W

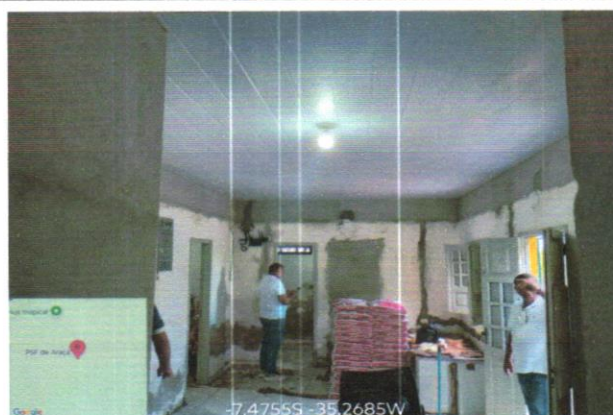


-7,4755S -35,2685W



-7,4755S -35,2685W

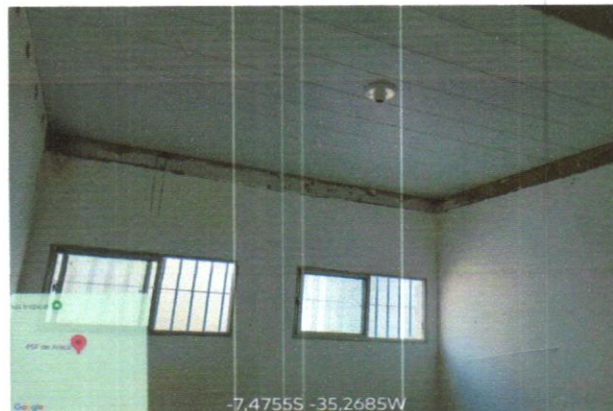

-7,4755S -35,2685W

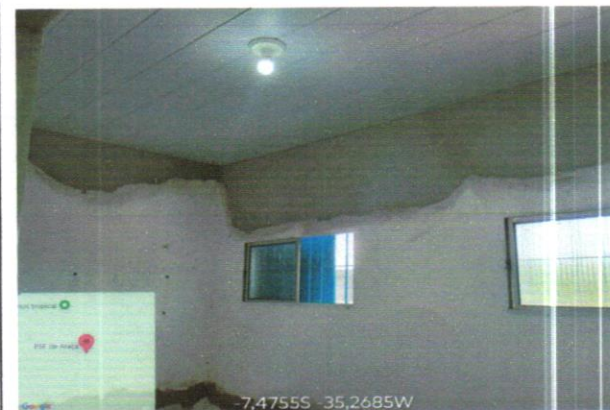

-7,4755S -35,2685W



-7,4755S -35,2685W

753 BR-408

Ferreiros 55880-000

Brasil

César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 543

OBRIGATORIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃOAssinado de forma digital por: TALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Dados: 2025.07.23 09:53:02 -0100'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATORONEY MARCOS
LOURENCO
MOREIRA:02042151459GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃOJOAO BATISTA DA
SILVA:0219498243Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DA
SILVA:0219498243
Data: 2025.07.23 10:57:15-0100'
