

BOLETIM DE MEDIÇÃO

005



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 26/04/2023

VALOR DA MEDIÇÃO: 28.771,11

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

CONTRATO: 064/2022 MODALIDADE: TP 002/2022 PRAZOS DE EXEC.: 11/08/2022 11/08/2023

ORDEM DE SERVIÇOS: 11/08/2022 PRAZO (DIAS): 365 ADITIVO (DIAS): - -

EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA PROPRIETÁRIO: JORGE AUGUSTO CABRAL DE LIMA

CNPJ: 38.935.406/0001-39 CPF: 037.558.394-74

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO PAULO BEZERRA DA SILVA CREA: 181915140-9 PE20220836106

CONTRATO R\$: 348.812,04

ADITIVO R\$: 0,00

C. ADITADO R\$: -

DATA FINAL: 11/08/2023

P. RESTANTE DIAS: 107

SALDO R\$: 322.195,10

A 26/04/2023

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA
FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA
ENGENHEIRO FISCAL: ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 24/02/2023
MATRÍCULA: 608-4
CREA/RPN: 160.666.136-1
CREA/RPN: 160.991.108-3 PE20220839419

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						95.222,04	6.511,11	26.616,94	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	400,68	3,00	0,00	3,00	1.202,04	0,00	1.202,04	100,00%
1.2	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	9,98	3.000,00	14,95	37,95	29.940,00	149,20	378,74	1,26%
1.3	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	10,68	6.000,00	595,69	2.344,21	64.080,00	6.361,91	25.036,16	39,07%
2.0	REPOSIÇÃO DE PARALELO						253.590,00	22.260,00	87.384,89	
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusivo paralelos, inclusive colchão de areia de 0,05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m2	37,11	6.000,00	595,69	2.344,21	222.000,00	22.105,87	86.993,63	39,07%
2.2	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 'MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(PEDRAS PEQUENAS DE 30 A 35 PEÇAS POR M²)	M	10,31	3.000,00	14,95	37,95	30.930,00	154,13	391,26	1,26%
TOTAL							348.812,04	28.771,11	114.001,83	32,68%

É OBRIGATORIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2023.04.26 15:55:36 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

João Paulo Bezerra
Eng. Civil
CREA 181915140-9
PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO



BM

005

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE **RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO**


ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	MEMÓRIA	OBSERVAÇÕES
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.2	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	9,98	3.000,00	14,95	14,95	Serviço em execução
1.3	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	10,68	6.000,00	595,69	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução
2.0 REPOSIÇÃO DE PARALELO							
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0,05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m2	37,11	6.000,00	595,69	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução
2.2	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(PEDRAS PEQUENAS DE 30 A 35 PEÇAS POR M²)	M	10,31	3.000,00	14,95	14,95	Serviço em execução

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por ITALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
Dados: 2023.04.26 15:55:52 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

João Paulo Bezerra
Eng. Civil
CREA 1819151409

PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO



**MEMÓRIA DE CÁLCULO
BOLETIM DE MEDIÇÃO 005**

OBRA: REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE
TOMADA DE PREÇOS 002/2022 - CONTRATO 064/2022
EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA

ORDEM	LOCAL	LAR.	COMP.	TAMANHO P/ M ²
1	Rua Francisco Trajano Maciel	5,60	1,00	5,60
		2,10	1,90	3,99
		3,50	1,20	4,20
		3,00	1,10	3,30
		2,30	0,90	2,07
		3,20	1,40	4,48
		1,30	1,70	2,21
		5,60	0,60	3,36
2	Rua José Dominges de Oliveira	1,50	1,10	1,65
		2,10	3,00	6,30
		2,70	2,25	6,08
		2,20	1,50	3,30
3	Capela Mãe Rainha	2,80	1,00	2,80
		22,50	0,30	6,75
4	Rua Seneval Nunes Machado Filho - Rua da Cadeia	4,10	3,80	15,58
		2,80	1,90	5,32
		1,50	2,20	3,30
		2,90	1,80	5,22
		3,70	3,00	11,10
5	Rua da Independência	6,20	1,40	8,68
		5,40	2,70	14,58
		6,10	5,20	31,72
6	Rua Lívio de Araújo de Souza	1,20	1,30	1,56
7	Rua Alberto Santos Dumont	22,00	5,40	118,80
8	Rua Severina Benvinda	2,00	2,00	4,00
		4,30	3,00	12,90
		5,20	2,70	14,04

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2023.04.26 15:56:05
-03'00'

João Paulo Bezerra
Eng. Civil
CREA 1819151409



**MEMÓRIA DE CÁLCULO
BOLETIM DE MEDIÇÃO 005**

OBRA: REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE
TOMADA DE PREÇOS 002/2022 - CONTRATO 064/2022
EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA

ORDEM	LOCAL	LAR.	COMP.	TAMANHO P/ M ²
		4,75	2,90	13,78
		1,70	1,90	3,23
9	Trevo Barão de Itambé	9,60	2,00	19,20
10	Rua Dom Helder Câmara	10,40	2,15	22,36
11	Rua Governador Miguel Arraes de Alencar	19,30	4,00	77,20
		2,70	3,40	9,18
		13,10	1,10	14,41
12	Rua Maria das Dores Ribeiro Lira	2,40	6,40	15,36
		1,20	1,80	2,16
		2,70	1,60	4,32
		3,20	1,60	5,12
		2,40	0,70	1,68
		2,10	1,00	2,10
		2,50	0,50	1,25
		2,50	5,60	14,00
		0,95	1,50	1,43
13	Rua José Paulino	3,10	8,80	27,28
		2,40	2,30	5,52
		3,70	4,70	17,39
14	Rua Gregório Lourenço Bezerra	5,60	6,40	35,84
Total em M²				595,69

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por ITALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
Dados: 2023.04.26 15:56:16 -03'00'

João Paulo Bezerra
Eng. Civil
CREA 1819151409

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

RUA ALBERTO SANTOS DUMOND



RUA SEVERINA BENVINDA



RUA DOM HELDER CÂMARA



RUA FRANCISCO TRAJANO MACIEL



RUA FRANCISCO TRAJANO MACIEL



ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:0796303142
9

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2023.04.26 15:56:34
-03'00'

João Paulo Bezerra
Eng. Civil
CREA 1818151409

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE


RUA SENEVAL NUNES MACHADO FILHO - RUA DA CADEIA



RUA MARIA DAS DORES RIBEIRO LIRA



RUA MIGUEL ARRAES DE ALENCAR

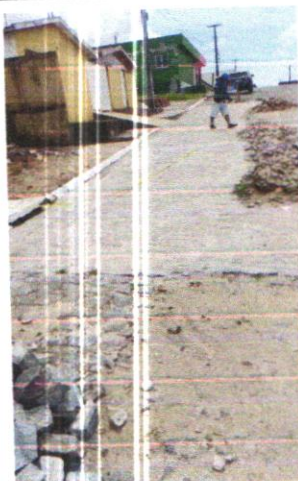

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:079630314
29

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2023.04.26 15:56:48
-03'00'

João Paulo Bezerra
Eng. Civil
CREA 1819157409


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

RUA DA INDEPENDÊNCIA



RUA GREGÓRIO LOURENÇO E AZEVEDO

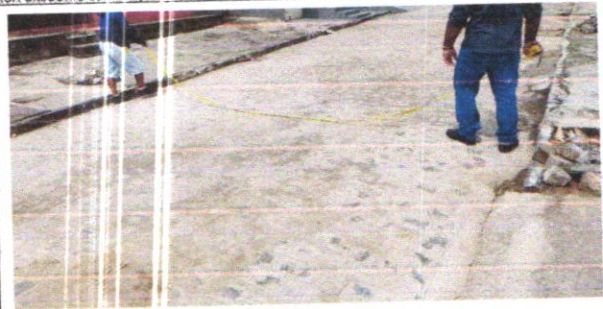

RUA LÍVIO ARAÚJO DE SOUZA



RUA JOSÉ PAULINO



TREVO BARÃO DE ITAMBÉ



DE OBRIGATORIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA:07963031429
Data: 2023.04.26 15:57:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE OBRAS

João Paulo Bezerra
Eng. Civil
CREA 18.1215/1409
PAPAINE SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO
