

BOLETIM DE MEDIÇÃO

007



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 23/10/2023

VALOR DA MEDIÇÃO: 24.087,04

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

CONTRATO: 064/2022 MODALIDADE: TP 002/2022 PRAZOS DE EXEC.: 11/08/2022 11/08/2023

ORDEM DE SERVIÇOS: 11/08/2022 PRAZO (DIAS): 365 ADITIVO (DIAS): 365 -

EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA PROPRIETÁRIO: JORGE AUGUSTO CABRAL DE LIMA

CNPJ: 38.935.406/0001-39 CPF: 037.558.394-74

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO PAULO BEZERRA DA SILVA CREA: 181.915.140-9 PE20220836106

CONTRATO R\$: 348.812,04

ADITIVO R\$: 0,00

C. ADITADO R\$:

DATA FINAL: 10/08/2024

P. RESTANTE DIAS: 292

SALDO R\$: 313.790,89

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA PERÍODO DE MEDIÇÃO: 31/07/2023

FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA MATRÍCULA: 608-4

ENGENHEIRO FISCAL: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA CREA/RPN: 160.666.136-1

CREA/RPN: 160.991.108-3 PE20220839419

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						96.222,04	5.464,60	35.021,15	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	400,68	3,00	0,00	3,00	1.202,04	0,00	1.202,04	100,00%
1.2	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	9,98	3.000,00	15,00	62,95	29.940,00	149,70	628,24	2,10%
1.3	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	10,68	6.000,00	497,65	3.107,76	64.080,00	5.314,90	33.190,87	51,80%
2.0	REPOSIÇÃO DE PARALELO						253.590,00	18.622,44	115.977,98	
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0,05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m²	37,11	6.000,00	497,65	3.107,76	222.660,00	18.467,79	115.328,97	51,80%
2.2	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 'MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(PEDRAS PEQUENAS DE 30 A 35 PEÇAS POR M²)	M	10,31	3.000,00	15,00	62,95	30.930,00	154,65	649,01	2,10%
TOTAL							348.812,04	24.087,04	150.999,13	43,29%

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
 Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
 Dados: 2023.10.23 12:14:50 -03'00'
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Claudionor Manoel de Oliveira
 Sec. de Obras e Urbanismo
 Mat. 608-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 GESTOR DE CONTRATO

PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO



Documento assinado digitalmente
 JOAO PAULO BEZERRA DA SILVA
 Data: 23/10/2023 13:36:39 -0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MEMORIAL DE CÁLCULO



BM 007

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE			OBSERVAÇÕES
				PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO	MEMÓRIA	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	9,98	3.000,00	15,00	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução
1.3	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	10,68	6.000,00	497,65	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução
2.0	REPOSIÇÃO DE PARALELO						
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m2	37,11	6.000,00	497,65	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução
2.2	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 'MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(PEDRAS PEQUENAS DE 30 A 35 PEÇAS POR M²)	M	10,31	3.000,00	15,00	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
Dados: 2023.10.23 12:15:02 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Claudionor Manuel de Oliveira
Sec. de Obras e Urbanismo
Mat. 608-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO



Documento assinado digitalmente:

JOAO PAULO BEZERRA DA SILVA

Data: 23/10/2023 13:34:58-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REPOSIÇÃO DE PARALELO
BOLETIM DE MEDIÇÃO 007**

OBRA: REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE
TOMADA DE PREÇOS 002/2022 - CONTRATO 064/2022
EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA

ORDEM	LOCAL	LAR.	COMP.	TAMANHO P/ M ²
1	SEVERINA BENVINDA DA CONCEIÇÃO	1,00	2,50	2,50
2	RUA PROJETADA 5 (RUA DE ZÉ PAULO)	2,30	9,60	22,08
3	RUA LÍVIO DE ARAÚJO	1,80	2,30	4,14
		3,30	4,90	16,17
		5,00	6,80	34,00
		1,50	3,00	4,50
		2,30	2,70	6,21
		5,00	9,00	45,00
4	RUA SENEVAL NUNES MACHADO FILHO	2,00	2,00	4,00
		2,20	3,60	7,92
		2,00	3,40	6,80
		2,40	1,20	2,88
		2,00	3,40	6,80
		3,30	14,00	46,20
5	PRAÇA 16 DE MARÇO	1,00	1,00	1,00
		1,30	2,20	2,86
		1,00	1,00	1,00
6	PRAÇA DOS TAXISTAS	1,00	1,00	1,00
		2,00	20,70	41,40
		1,00	1,00	1,00
7	RUA MARECHAL CANDIDO RONDON	1,00	1,00	1,00
		2,00	20,70	41,40
8	RUA BARÃO DE ITAMBÉ	5,00	25,00	125,00
		5,00	4,50	22,50
9	AVENIDA MIGUEL ARRAES DE ALENCAR	8,20	10,00	82,00
		1,00	2,90	2,90
10	RUA MONSENHOR JULIO MARIA	3,00	0,30	0,90
		1,00	1,00	1,00
		1,00	1,00	1,00
		1,50	1,00	1,50

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO PAULO BEZERRA DA SILVA
Data: 23/10/2023 13:33:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:0796303142
9

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA:07963031
Dados: 2023.10.23 12:11:
-03'00'


Cleonice Manoel de Oliveira
Sec. de Obras e Urbanismo
Mat. 608-4



**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REPOSIÇÃO DE PARALELO
BOLETIM DE MEDIÇÃO 007**

OBRA: REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE
TOMADA DE PREÇOS 002/2022 - CONTRATO 064/2022
EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA

ORDEM	LOCAL	LAR.	COMP.	TAMANHO P/ M ²
		0,60	0,50	0,30
		0,50	0,50	0,25
		0,30	0,30	0,09
		0,50	1,00	0,50
		1,00	1,00	1,00
		0,50	0,50	0,25
		1,00	1,00	1,00
		1,00	1,00	1,00
Total em M²				497,65

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
31429

Assinado de forma digital
por ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
Dados: 2023.10.23
12:16:19 -03'00'


João Paulo Bezerra da Silva
Sec. de Obras e Urbanismo
Mat. 608-4



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BEZERRA DA SILVA
Data: 23/10/2023 13:31:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEIO FIO
BOLETIM DE MEDIÇÃO 007

OBRA: REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

TOMADA DE PREÇOS 002/2022 - CONTRATO 064/2022

EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA

ORDEM	LOCAL	COMP.	TAMANHO P/ M
1	RUA PROJETADA 5 (RUA ZÉ PAULO)	15,00	15,00
Total em M			15,00

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:079630
31429

Assinado de forma digital
por ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
Dados: 2023.10.23
12:16:32 -03'00'


Coordenador de Obras
Coord. de Obras e Urbanismo
Mat. 608-4



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BEZERRA DA SILVA
Data: 23/10/2023 13:08:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIS. RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

RUA SENEVAL NUNES MACHADO FILHO



RUA SENEVAL NUNES MACHADO FILHO




RUA BARÃO DE ITAMBÉ



RUA BARÃO DE ITAMBÉ



RUA MONSENHOR JULIO MARIA

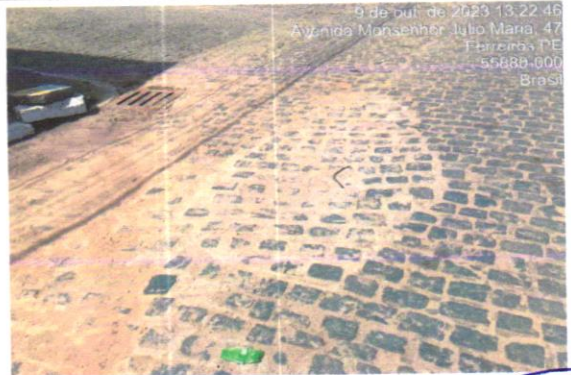

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429

gov.br

Documento assinado digitalmente JOAO PAULO BEZERRA DA SILVA

Assinado digitalmente JOAO PAULO BEZERRA DA SILVA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VAZ, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE


RUA LÍVIO DE ARAÚJO



RUA PROJETADE 5



RUA SEVERINA BENVINDA

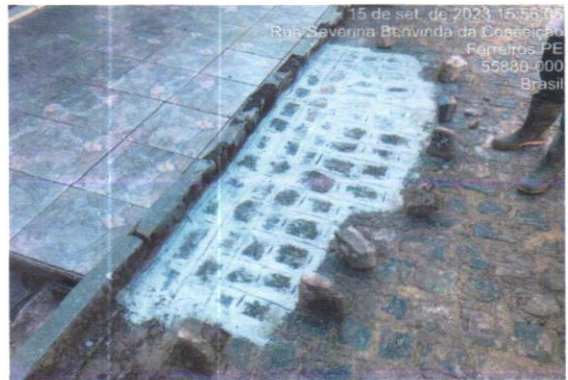

PRAÇA 16 DE MARÇO



AV. GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR



RUA MARECHAL CANDIDO RONDON



Documento assinado digitalmente

É OBRIGATORIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO



JOAO PAULO BEZERRA DA SILVA Data: 23/10/2023 12:54:21-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br

GESTOR DE CONTRATO

PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Handwritten signature and stamp of Claudio Henrique de Oliveira, Gerente de Obras e Urbanismo, Tel. 608-4
